


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進ちょく状況

令和6年4月1日現在

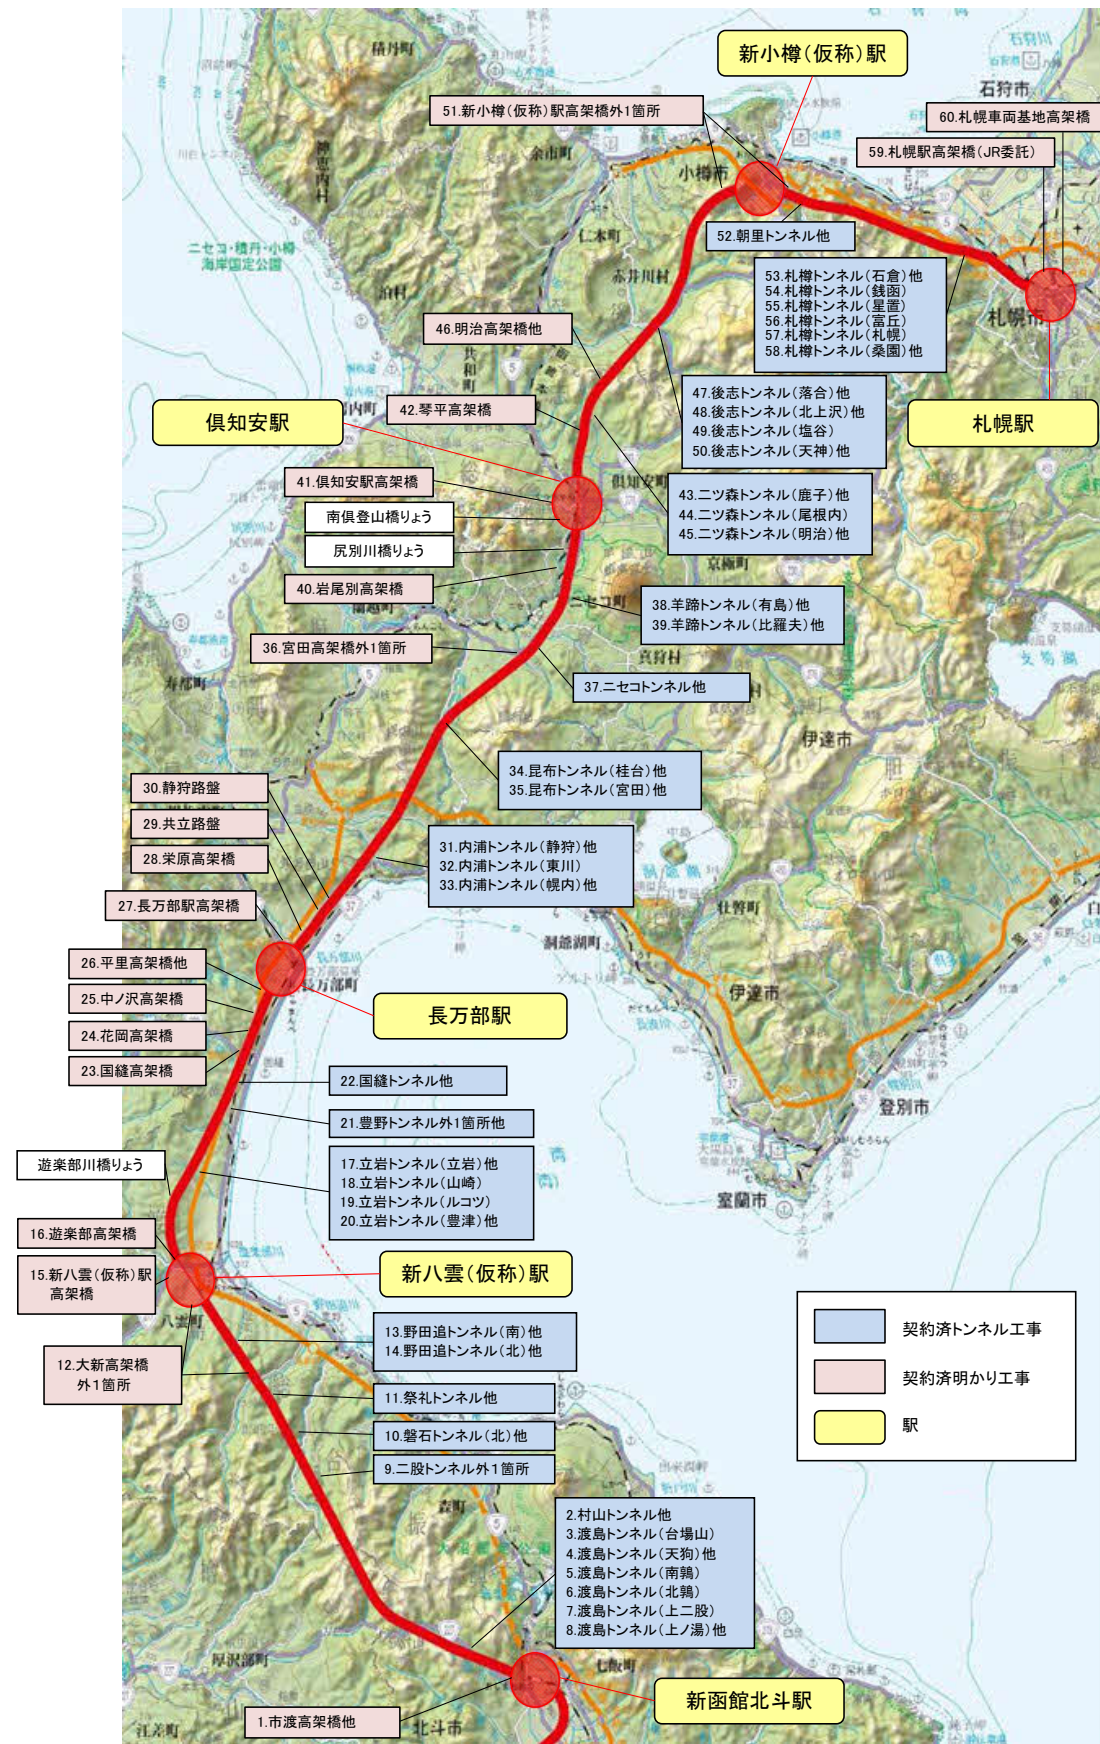

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	99%	74%

●工事状況

本坑掘削完了	15工区
本坑掘削中	25工区
明かり工事施工中	16工区
準備中	4工区
計	60工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

トンネル工事進ちょく状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	併用区間により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,310m	37%	469m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	3,574m	78%	1,964m	
5	渡島トンネル(南鶉)	3,900m	1,238m	32%	108m	
6	渡島トンネル(北鶉)	5,510m	5,010m	91%	3,605m	
7	渡島トンネル(上二股)	4,540m	3,545m	78%	443m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,300m	3,748m	71%	3,155m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,931m	95%	2,220m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	2,772m	88%	1,875m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,836m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,775m	3,775m	100%	2,525m	
14	野田追トンネル(北)他	4,450m	4,153m	93%	3,402m	
17	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
18	立岩トンネル(山崎)	4,960m	4,596m	93%	3,234m	
19	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	5,000m	100%	4,342m	
20	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	2,065m	100%	1,460m	
21	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	2,165m	100%	1,369m	幌内トンネルを含む
22	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	1,330m	
31	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	4,225m	76%	3,120m	
32	内浦トンネル(東川)	5,000m	2,617m	52%	1,299m	
33	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	5,000m	100%	4,499m	
34	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
35	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
37	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
38	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	2,434m	58%	945m	
39	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,605m	65%	2,540m	
43	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
44	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	3,944m	85%	2,387m	
45	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	1,328m	41%	540m	
47	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,763m	
48	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
49	後志トンネル(塩谷)	4,050m	2,706m	67%	288m	
50	後志トンネル(天神)他	4,460m	2,417m	54%	1,526m	
52	朝里トンネル他	4,328m	3,871m	89%	2,610m	
53	札幌トンネル(石倉)他	4,506m	1,734m	38%	0m	
54	札幌トンネル(銭函)	5,100m	1,138m	22%	0m	
55	札幌トンネル(星置)	3,300m	684m	21%	0m	
56	札幌トンネル(富丘)	4,500m	1,821m	40%	0m	
57	札幌トンネル(札幌)	8,446m	1,430m	17%	0m	
58	札幌トンネル(桑園)他	346m	115m	33%	0m	進ちょく率から求めた換算値
合計		168,926m	125,649m	-	90,243m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋りょう工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	高架橋、橋脚基礎工事中
15	新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	高架橋、橋脚基礎工事中
16	遊楽部高架橋	1,083m	高架橋、橋脚基礎工事中
23	国縫高架橋	2,138m	高架橋、橋脚基礎工事中
24	花岡高架橋	2,639m	準備中
25	中ノ沢高架橋	1,876m	高架橋、橋脚基礎工事中
26	平里高架橋他	1,838m	高架橋工事中
27	長万部駅高架橋	2,319m	準備中
28	栄原高架橋	2,534m	高架橋、橋脚基礎工事中
29	共立路盤	3,921m	準備中
30	静狩路盤	4,390m	高架橋工事中
36	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋工事中
40	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋、橋脚基礎工事中
41	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋、橋脚基礎工事中
42	琴平高架橋	3,395m	準備中
46	明治高架橋他	976m	高架橋、橋脚工事中
51	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	高架橋基礎工事中
58	札幌トンネル(桑園)他	659m	高架橋、橋脚基礎工事中
59	札幌駅高架橋(JR委託)	799m	新幹線高架橋、在来線改修工事中
60	札幌車両基地高架橋	1,344m	高架橋、橋脚基礎工事中

設備工事進ちょく状況

No	工事種類	工区名	備考
61	軌道工事	基準器設置	基準器設置工事中

1.市渡高架橋他

高架橋工事状況



19.立岩トンネル(ルコツ)

防水工状況



33.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況



44.ニツ森トンネル(尾根内)

坑内状況



50.後志トンネル(天神)他

覆工状況

